




RELATÓRIO ANUAL PDTIC 2025-2030

2025

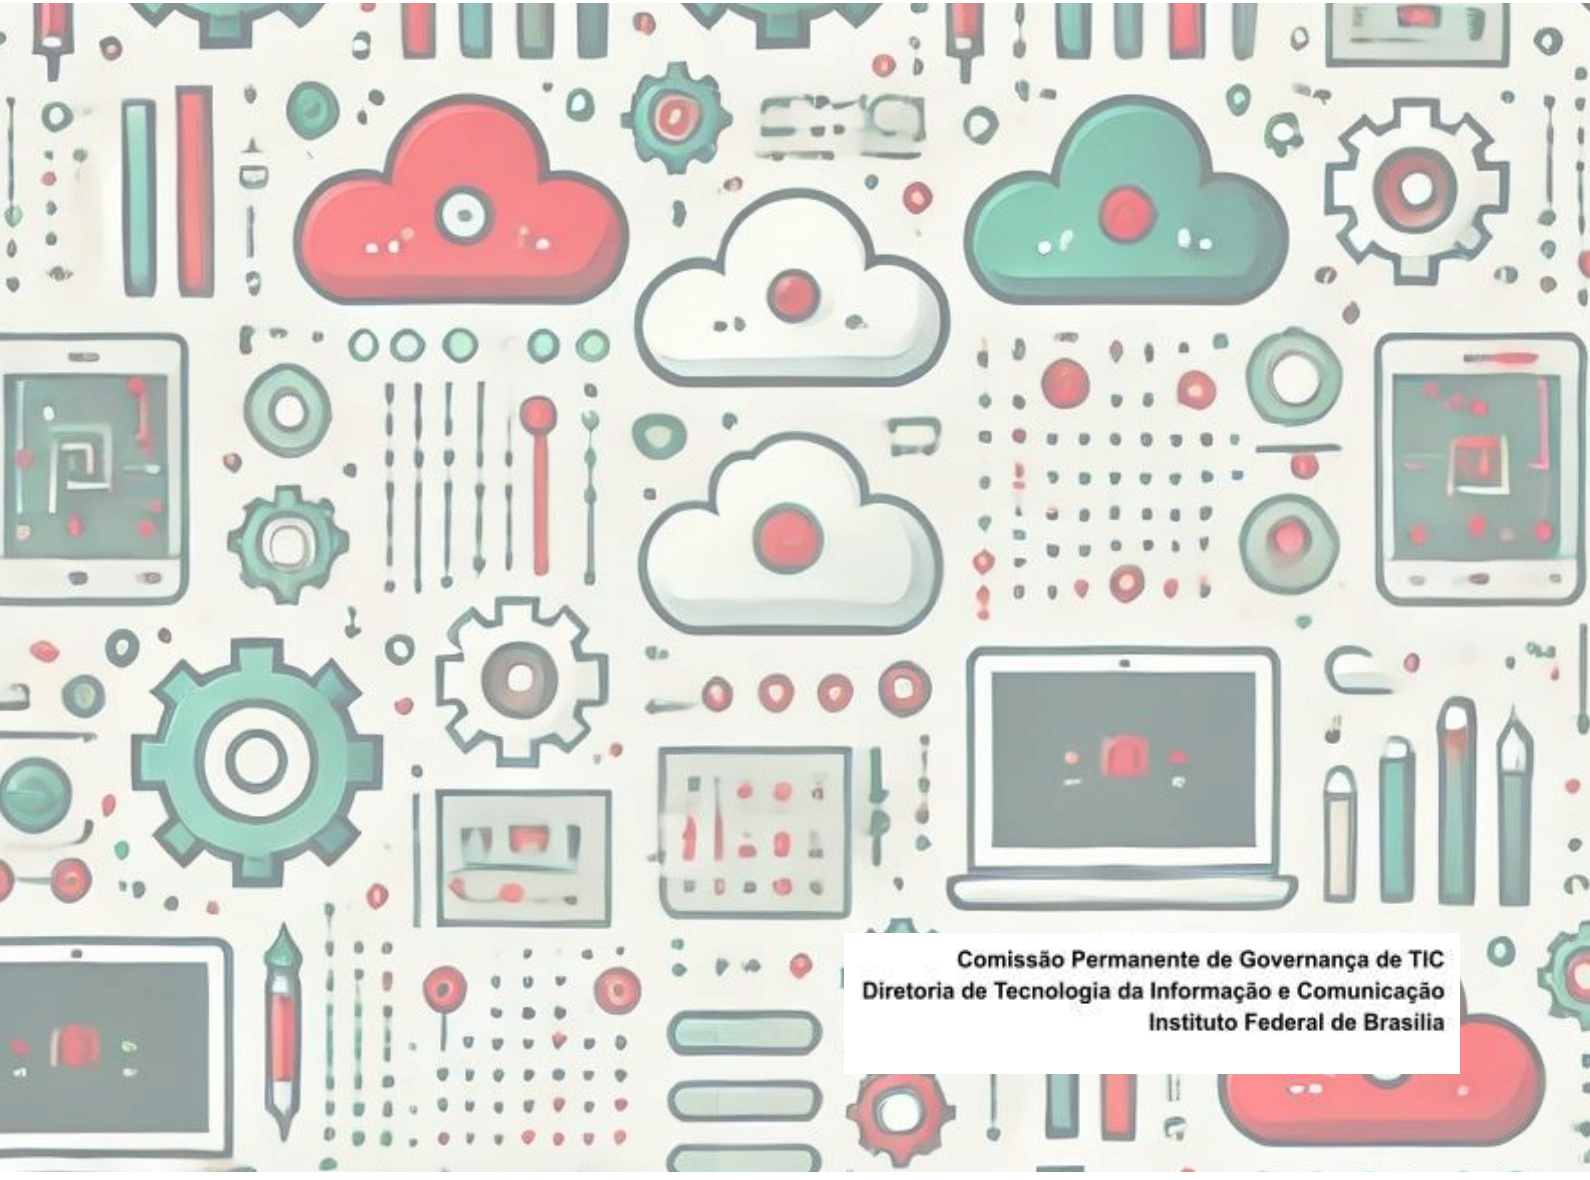

Comissão Permanente de Governança de TIC
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Instituto Federal de Brasília



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Equipe Responsável pela Elaboração do Relatório

Diretor de TIC

João Victor de Araujo Oliveira

Diretor de TIC Substituto

João Bezerra da Silva Junior

Coordenadores de TIC

Erlan Tostes - Sistemas

Daniel Sousa - Infraestrutura

Governança de TIC

João Bezerra Jr

Waldene Watanabe

Luciana Matos

Ivone Perosa

Período de Elaboração

Ano de 2025

Relatório submetido à apreciação do Comitê de

Governança Digital

Março de 2026



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Lista de Termos, Abreviações e Siglas.....	3
3. Acompanhamento do ano de 2025.....	4
3.1 Portfólio de programas e projetos de 2025.....	4
3.3 Percentual de execução dos Projetos.....	4
3.3.1 Evolução do Programa - Prover Infraestrutura de TIC.....	5
3.3.2 Evolução do Programa - Transformação digital dos serviços.....	7
3.3.3 Evolução do Programa - Avaliação dos Serviços.....	8
3.3.4 Evolução dos Programas - Implementação do modelo de Governança do SISP e Gestão.....	9
3.3.5 Evolução do Programa - Desenvolvimento e Implantação de Sistemas.....	11
3.3.6 Evolução do Programa - Planejamento das Contratações e Aquisições.....	14
3.3.7 Evolução do Programa - Fortalecer Segurança da Informação.....	15
3.3.8 Evolução do Programa - Integração e Capacitação de Pessoal.....	17
4. Síntese da Execução dos Projetos.....	18
5. Considerações Finais.....	21
6. Resultados PDI 2024/2030 - DTIC (Ano 2025).....	21
7. Projetos 2026.....	22



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Apresentação

Este documento, elaborado pela **Comissão Permanente de Governança de TIC** do **IFB**, apresenta o progresso dos projetos previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício de 2025. Utilizando mecanismos de monitoramento e controle, o relatório analisa indicadores e resultados para garantir que as ações de Tecnologia da Informação apoie efetivamente o cumprimento da **missão institucional**.

1. Introdução

O relatório traz o monitoramento dos **57 projetos** previstos para 2025, vinculados aos **8 objetivos estratégicos** do PDTIC 2025-2030.

O progresso é classificado pelo percentual de execução, definido pelas seguintes situações: **Não iniciado, Iniciado, Em andamento, Parcialmente finalizado e Finalizado**.



2. Lista de Termos, Abreviações e Siglas

SIGLA	DESCRIÇÃO
CGD	Comitê de Governança Digital
CITIC	Coordenação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
CSTIC	Coordenação de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação
DTIC	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
GOVTIC	Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
IFB	Instituto Federal de Brasília
OEs	Objetivos Estratégicos
PDI	Plano de Desenvolvimento Institucional
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
PS-ETP	Processo Seletivo - Ensino Técnico Profissionalizante
PS-FIC	Processo Seletivo - Formação Inicial e Continuada
PS-GRAD	Processo Seletivo - Graduação
PS-POS GRAD	Processo Seletivo - Pós Graduação
PS-EAD	Processo Seletivo - Ensino a Distância
MAT-ETP	Matrícula - Ensino Técnico Profissionalizante
MAT-FIC	Matrícula - Formação Inicial e Continuada
MAT-GRAD	Matrícula - Graduação
MAT-EAD	Matrícula - Ensino a Distância
VoIP	Voz sobre IP
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
SGA	Sistema de Gestão Acadêmica

3. Acompanhamento do ano de 2025

3.1 Portfólio de programas e projetos de 2025

Com o objetivo de cumprir com o atendimento às necessidades institucionais, parte dos projetos do portfólio do PDTIC foram considerados para execução em 2025, conforme aprovação da súmula 08/2024, 19 de dezembro de 2024.

Após o início da operacionalização do portfólio, identificou-se que 3 (três) dos 57 projetos não seriam mais executados por indisponibilidade de recurso orçamentário, sendo eles: N6.31 - Aquisição de Servidores, N6.32 - Aquisição de Cofre e N6.25 - Gestão de Registros de Auditoria.

No decorrer do período alguns projetos foram cancelados em detrimento de outras demandas não planejadas.

3.3 Percentual de execução dos Projetos

Nesta seção, apresenta-se, de forma detalhada, a execução dos projetos no ano de 2025, incluindo as informações de projeto, responsável, percentual de execução, situação e observações, organizadas por programas vinculados aos objetivos estratégicos.

Os percentuais de execução dos programas foram calculados com base na média de execução dos projetos associados.

A situação dos projetos é classificada conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Legenda da situação dos projetos

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Não Iniciado	projeto não atendido
Iniciado	corresponde até 25% de execução do projeto
Em Andamento	corresponde a > 25% e < 75% de execução do projeto
Parcialmente Finalizado	corresponde a > ou = 75% de execução do projeto
Finalizado	projeto 100% concluído

3.3.1 Evolução do Programa - Prover Infraestrutura de TIC

Este programa contempla 11 projetos e está vinculado ao Objetivo Estratégico 1 – Prover a Infraestrutura de TIC e a Conectividade de Dados. As iniciativas referem-se, principalmente, à aquisição e implantação de soluções de infraestrutura, sob responsabilidade da Coordenação de Infraestrutura.

No exercício de 2025, observou-se que parte dos projetos não foi iniciada, em sua maioria devido à dependência de processos de contratação. Os projetos concluídos referem-se, sobretudo, a iniciativas já estruturadas ou com menor dependência externa.

O programa apresentou execução parcial, com projetos distribuídos entre as situações de não iniciado, em andamento e finalizado.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **47,27%**, calculado com base na média do percentual de execução dos projetos.

No quadro 2 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Obs:

Quadro 2 - Relação de Projetos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Prover Infraestrutura de TIC- Objetivo Estratégico 1

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 - PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC E A CONECTIVIDADE DE DADOS PROGRAMA: PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC Responsável: Coordenação de Infraestrutura de TIC			
Projeto	% Execução	Situação	Observação
N1.10 - Provimento da expansão da rede nos campi	0%	Não iniciado	A implantação teve de ser adiada, pois esse projeto depende da Contratação da Solução de Expansão da Rede Wi-Fi que foi concluída e empenhada em dezembro de 2025 Essa ação deverá ser realizada em 2026 após o recebimento dos equipamentos.
N1.4 - Implantação da solução de VoIP	100%	Finalizado	Realizada a implantação efetiva da solução de VoIP, o que contribui para a modernização da estrutura (antes analógica e agora digital) e redução dos custos de telefonia.
N1.5 - Atualização / modernização do registro de nomes autorizados do IFB na internet	100%	Finalizado	Foram realizadas melhorias nos sistemas que garantem o acesso aos serviços online da instituição, tornando-os mais seguros, estáveis e eficientes. Projeto finalizado sem o registro.br, pois a gestão do serviço está em fase de adesão com a RNP.

N1.6 - Migração do Active Directory	40%	Em andamento	Foi iniciada a atualização dos sistemas internos de gestão de usuários da instituição, com avanços importantes na modernização da infraestrutura. Ainda restam ajustes no acesso ao Portal do Estudante a ser investigado pela Coordenação de Sistemas e a conclusão do projeto depende da aquisição do Windows Server que está em andamento.
N1.7 - Criação do Ambiente de Restore e Desenvolvimento	0%	Não iniciado	O projeto não foi iniciado devido à priorização de demandas mais críticas que exigiram dedicação da equipe técnica.
N1.8 - Planejamento do parque tecnológico dos novos campi	60%	Em andamento	Elaboração da documentação do planejamento concluída. Para implementar será necessário a aquisição dos equipamentos e conclusão da obra de construção predial. Previsão de continuidade em 2026.
N1.9 - Implantação de um serviço de Arquivos Institucional	100%	Finalizado	O serviço de arquivos institucional foi implantado e disponibilizado para todas as unidades. A migração dos arquivos ocorre gradualmente conforme disponibilidade dos usuários, com exceção do Campus Gama que ainda não confirmou adesão.
N1.11 - Realização de estudo técnico da solução de segurança de perímetro de redes do IFB	100%	Finalizado	O documento apresenta um estudo técnico para melhorar a segurança da rede da instituição, identificando riscos e propondo melhorias. Como resultado, foram feitos ajustes práticos e definidos padrões que tornam os serviços digitais mais seguros e organizados.
N1.12 - Adoção de um ambiente Kubernetes	0%	Não iniciado	Será iniciado a partir do projeto de Modernização do SUAP, previsto para 2026.
N1.13 - Migração do Domínio de Email	20%	Iniciado	Em dezembro de 2025, o projeto alcançou uma etapa em que os usuários precisavam ser informados sobre a migração, com o apoio da DICOM. No entanto, no decorrer de 2026 o projeto prosseguiu e a migração foi concluída com sucesso em abril de 2026. ATUALIZAÇÃO: 100% - FINALIZADA EM MARÇO DE 2026!
N1.14 - Modernização / Atualização da infraestrutura de ativos de rede	0%	Não iniciado	O projeto será iniciado após a conclusão de demandas prioritárias e está vinculado à implantação da solução de expansão da rede Wi-Fi, já contratada e empenhada em dezembro de 2025. A previsão é de início e continuidade das atividades ao longo de 2026.

3.3.2 Evolução do Programa - Transformação digital dos serviços

Este programa contempla 10 projetos e está vinculado ao Objetivo Estratégico 2 – Promover a Transformação Digital. As iniciativas envolvem, principalmente, o desenvolvimento e a disponibilização de serviços digitais.

Em 2025, verificou-se baixo avanço na execução dos projetos pela Coordenação de Sistemas, com predominância de iniciativas não iniciadas. Esse cenário está associado, principalmente, à limitação de capacidade laboral e à priorização de demandas institucionais, o impacto da execução de projetos não-previstos (Quadro 6), além de impactos decorrentes da implantação do SUAP-EDU, que demandou reavaliação de escopo de parte dos projetos.

O programa apresentou execução inicial, com poucos projetos em andamento e apenas uma iniciativa concluída.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **18%**, evidenciando baixo nível de execução no período.

No quadro 3 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Quadro 3 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Transformação Digital dos Serviços- Objetivo Estratégico 2

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PROGRAMA: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS Responsável: Coordenação de Sistemas de TIC							
Projeto	% Execução	Concep.	Dev.	Homol. e ajustes	Implant.	Situação	Resultado
N2.1 - Emissão de 2a via de Diploma	50%	✓	✓			Em andamento	A estrutura inicial dos projetos de transformação digital foi estabelecida, restando a personalização dos serviços. Em função da implantação do SUAP-EDU, houve necessidade de reavaliação das iniciativas, com previsão de retomada no segundo semestre de 2026. Destaca-se que, embora a base para o funcionamento do balcão digital esteja disponível, sua execução não foi priorizada no período, em razão de limitações de equipe e alta demanda institucional.
N2.2 - Emissão de Certificação Encceja	100%	✓	✓	✓	✓	Finalizado	O serviço digital de solicitação da Certificação Encceja foi implementado com sucesso e encontra-se disponível ao público. A solução já está em funcionamento no portal Gov.br, facilitando o acesso dos cidadãos ao serviço.

N2.3 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Formação Inicial e Continuada - PS-FIC	0%	-	-	-	-	Não Iniciado	Apesar de ter ocorrido uma implementação inicial dos serviços digitais, a implantação do SUAP Edu acabou suprimindo os esforços despendidos no período de 2025. Considerando as alterações nas regras de negócio, as iniciativas terão de ser reavaliadas para a continuidade do projeto de TD em 2026. OBS: MAT-GRAD - Antes das alterações nas regras de negócio, foram executadas ações de concepção e desenvolvimento desse serviço, sendo denominado, solicitação de matrícula.
N2.4 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Ensino Profissional e Técnico - PS - EPT	0%	-	-	-	-	Não Iniciado	
N2.5 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Graduação PS-GRAD	0%	-	-	-	-	Não Iniciado	
N2.6 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Educação à Distância - PS- EAD	0%	-	-	-	-	Não Iniciado	
N2.7 - Realização de Matrícula em Curso de Formação Inicial e Continuada - MAT-FIC	0%	-	-	-	-	Não Iniciado	
N2.8 - Realização de Matrícula em Curso de Ensino Profissional e Técnico - MAT-EPT	0%	-	-	-	-	Não Iniciado	
N2.9 - Realização de Matrícula em Curso de Graduação - MAT-GRAD	30%	✓		-	-	Iniciado	
N2.10 - Realização de Matrícula em Curso de Educação à Distância - MAT-EAD	0%		-	-	-	Não Iniciado	

3.3.3 Evolução do Programa - Avaliação dos Serviços

Este programa contempla 3 projetos e está vinculado ao Objetivo Estratégico 3 – Assegurar a Qualidade e a Disponibilidade dos Serviços. As iniciativas referem-se à prestação de serviços de atendimento de chamados e à avaliação da qualidade dos serviços de TIC.

Trata-se de ações contínuas, cujo acompanhamento ocorre por meio de indicadores de atendimento e satisfação dos usuários.

Em 2025, observou-se desempenho satisfatório na qualidade dos serviços avaliados, com alto índice de aprovação pelos usuários, apesar de limitações na capacidade de atendimento em algumas áreas.

Por se tratar de ações contínuas, o desempenho do programa foi avaliado com base em indicadores de atendimento e satisfação, não sendo aplicável o cálculo de percentual médio de execução.

No quadro 4 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Quadro 4 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Avaliação dos Serviços - Objetivo Estratégico 3

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - ASSEGURAR A QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS PROGRAMA: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS Responsável: Governança de TIC				
Projeto	Responsável	% de atendimento	Situação	Observação
Prestação de atendimento de chamado técnico	CITIC/CSTIC	85%	Prestação de serviço contínuo	O percentual de atendimento das coordenações é calculado com base no número de chamados atendidos dividido pelo número de chamados abertos. A CSTIC apresentou um percentual de 74,4% de atendimento dos chamados, em virtude da escassez de recurso pessoal/técnico. A CITIC por sua vez, apresentou um percentual de atendimento de 95,7%.
Projeto	Responsável	% de satisfação	Situação	Observação
Avaliação de serviço de infraestrutura	CITIC	96,18%	Avaliação contínua	Dos 859 chamados atendidos entre jan/2025 e dez/2025, 470 foram avaliados, dos chamados avaliados, 99,57% foram considerados “Bom” ou “Excelente”. Obs: Apenas 54,71% dos chamados foram avaliados.
Avaliação de serviço de sistemas	CSTIC	99,57%	Avaliação contínua	Dos 651 chamados atendidos entre jan/2025 e dez/2025, 236 foram avaliados, dos chamados avaliados, 96,18% foram considerados “Bom” ou “Excelente”. Obs: Apenas 36,25% dos chamados foram avaliados.

3.3.4 Evolução dos Programas - Implementação do modelo de Governança do SISP e Gestão

Este item abrange os programas de Implementação do Modelo de Governança do SISP e Gestão, vinculados ao Objetivo Estratégico 4 – Fortalecer a Governança de TIC. As iniciativas visam ao aprimoramento dos mecanismos de governança, monitoramento e gestão do PDTIC.

Em 2025, verificou-se avanço relevante na execução das ações, com predominância de projetos parcialmente finalizados e em andamento, além de iniciativas concluídas.

Destacam-se os avanços relacionados à formalização de instrumentos de governança e ao acompanhamento do PDTIC, ainda que persistam desafios na implementação de ações estruturantes.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **66,66%**, indicando avanço relevante na implementação das ações previstas.

No quadro 5 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Quadro 5 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados aos Programas - Implementação do Modelo de Governança e Gestão - Objetivo Estratégico 4

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 - FORTALECER A GESTÃO DE GOVERNANÇA DE TIC PROGRAMAS: IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA DO SISP e GESTÃO* Responsável: Governança de TIC				
Projeto	Responsável	% Execução	Situação	Observação
N4.1 - Envolvimento da alta administração nas iniciativas de TIC	GovTIC	80%	Parcialmente Finalizado	O envolvimento da alta administração nas iniciativas de TIC necessita ser fomentado anualmente, assim, dado que foram realizadas pelo menos 3 reuniões do CGD em 2025, quase atendendo na totalidade, o que está previsto no Regimento (4 reuniões anuais), o envolvimento da alta administração é considerado satisfatório. ATUALIZAÇÃO: Em 2026 estamos em 25% com a primeira reunião do CGD em abril.
N4.2 - Especificação e formalização dos direitos decisórios sobre a TIC	GovTIC	100%	Finalizado	O documento que define os direitos decisórios sobre a TIC foi elaborado e publicado, formalizando responsabilidades e processos de decisão.
N4.3 - Implantação de mecanismos para a governança para a “gestão de risco”	GovTIC	90%	Parcialmente finalizado	Para implantar a Governança de TIC o SISP prevê a execução de 7 etapas, que inclui desde o envolvimento da alta administração, planejamento estratégico, elaboração do portfólio, ações de transparência, bem como a implantação de uma gestão de riscos , que ainda necessita ser revisada para ser submetida ao CGD. Será analisada pela Direção de TIC após revisão final.
N4.4 - Implantação de mecanismos para comunicação e transparência das ações de TIC	GovTIC	0%	Não iniciado	Projeto não executado, pois não houve tempo hábil, nem priorização interna, diante de outras demandas.

N4.6 - Implantação do Monitoramento do desempenho da TIC	GovTIC	50%	Em andamento	O monitoramento das ações de TIC é realizado por meio de planilhas que registram e acompanham o andamento dos projetos e do portfólio institucional. Paralelamente, está em desenvolvimento uma proposta de automatização utilizando o GTI como sistema oficial de gestão de projetos.
Acompanhamento do PDTIC (dashboard - metas e indicadores)*	GovTIC	80%	Parcialmente Finalizado	Foi criada uma ferramenta para acompanhar o PDTIC, mas os dados ainda estão sendo ajustados, sendo utilizado provisoriamente o SGI como referência. Para 2026, espera-se aprimorar a gestão de projetos, tornando o acompanhamento mais rápido, confiável e preciso.

3.3.5 Evolução do Programa - Desenvolvimento e Implantação de Sistemas

Este programa contempla 6 projetos e está vinculado ao Objetivo Estratégico 5 – Promover o Desenvolvimento, a Manutenção e a Integração de Sistemas. As iniciativas referem-se à evolução de sistemas institucionais, com destaque para os Módulos do SUAP.

Em 2025, observou-se avanço significativo na execução do programa, com predominância de projetos em estágio avançado e iniciativas concluídas, soluções relevantes para o funcionamento institucional, ainda que parte das ações tenha continuidade prevista para o exercício seguinte.

Adicionalmente, foram executadas iniciativas não previstas originalmente no planejamento, em atendimento a demandas institucionais prioritárias, duplicando o quantitativo de projetos no programa.

Essas ações evidenciam a capacidade de adaptação da área de TIC frente a demandas emergentes, ao mesmo tempo em que impactam a execução do planejamento inicialmente estabelecido. Pois, dos 6 projetos previstos para 2025, apenas 2 foram concluídos.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **71,66%**, refletindo um bom nível de execução das iniciativas planejadas, considerando a quantidade reduzida de servidores no setor. Ao incluir os projetos executados que surgiram no decorrer do ano, esse percentual passa a ser **77,5%**.

No quadro 6 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles. Ressalta-se que o ícone  (indica que a fase foi concluída) e  (indica que a fase está em andamento).

Quadro 6 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Desenvolvimento e Implantação de Sistemas - Objetivo Estratégico 5

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS <i>Responsável: Coordenação de Sistemas de TIC</i>

Projeto	% Execução	Concep.	Dev.	Homol. e ajustes	Implant.	Observação
N5.2 - Implantação do SUAP-EDU	100%	✓	✓	✓	✓	Um curso piloto no CSSB (EMI) foi implantado. Os demais cursos e dados foram migrados do SGA para o SUAP-EDU. Atualmente está em execução o projeto de Modernização do SUAP que tem o objetivo de prover melhoria da performance e da manutenção do sistema.
N5.3 - Implantação do DOCKER no SUAP	50%	✓	✓	↺		Este projeto será continuado a partir do projeto de modernização do SUAP, via Fundação CEFETMINAS. O Processo de contratação da fundação foi finalizado e a previsão de início das atividades será em janeiro de 2026.
N5.5 - SUAP Pesquisa/ Extensão	80%	✓	✓	✓		O Módulo Extensão já se encontra em funcionamento e usado pela instituição. O Módulo Pesquisa está parcialmente funcional, visto que há necessidade de integração com a plataforma Extrai Lattes, que será integrada em 2026. ATUALIZAÇÃO: Previsão de correção da integração para o primeiro semestre de 2026.
N5.6 - Implementação da Assinatura Digital nos certificados ENCCEJA	100%	✓	✓	✓	✓	O serviço foi implantado e permite ao cidadão solicitar a certificação Encceja online, com emissão e assinatura digital do certificado pelo IFB.
N5.7 - Desenvolvimento e Implantação do SUAP Assistência Estudantil	50%	✓	✓	↺		Módulo entregue para homologação da PREN após correção de problemas de navegação. Vale ressaltar que a conformidade do módulo com as atuais demandas institucionais esteve fora do escopo do projeto SUAP-EDU e pode ser visto como um projeto de personalização do módulo. Após a participação dos bolsistas do CEFET-MG, houve a necessidade de novos ajustes, solicitados pela PREN, os quais estão sendo desenvolvidos com previsão de melhorias em 2026. ATUALIZAÇÃO: Precisa ser avaliado pela PREN e, a partir da análise de negócio realizada, verificar possíveis ajustes no módulo e definição do escopo de funcionalidades a serem ativadas.
N5.18 - Padronização de ambientes de desenvolvimento de sistemas	50%	✓	✓			O Projeto começou a ser executado com a reestruturação do cofre de senhas da equipe. Está em fase de elaboração o inventário da lista de máquinas usadas em ambiente de desenvolvimento.

PROJETOS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS						
Implantação do Portal Integra	100%	✓	✓	✓	✓	O Integra já se encontra em produção. Todas as configurações iniciais foram realizadas e os passos solicitados para implantação foram atendidos.
Implantação do Portal do Candidato (IFC)	75%	✓	✓	✓	↺	Está em etapa de homologação, sendo realizado com o Julimar. Recebemos do IFC uma nova atualização. Estamos trabalhando para implantar a atualização. ATUALIZAÇÃO: O portal do Candidato foi colocado em ambiente de produção e está em fase final de ajustes para o lançamento oficial
Atualização dos dados do SISSA	75%	✓	✓	✓		Com o encerramento do contrato do estagiário, o projeto está interrompido por ora (suspensão). A demanda atual era a atualização dos dados via SGA. Cabe salientar de que o SGA será descontinuado em 2026, devido a adoção do SUAP-EDU, sendo assim a área de Ensino deverá verificar a necessidade de continuidade ou não dessa colaboração.
Portal do IFB	50%	✓	✓	↺		Faltam ajustes de layout e importação dos dados do antigo portal para o novo. Em especial da necessidade de adequações para que o portal utilize o Design System do Governo Federal ATUALIZAÇÃO: Design System do governo já foi implantado, faltando alguns ajustes, em especial na exibição das notícias. Além disso, já foram migradas as notícias, faltando alguns ajustes na categorização do material legado.
Apoio nas Eleições usando o sistema Helios Voting	100%	✓	✓	✓	✓	Eleições rodando conforme o esperado. Durante o ano houveram inconsistências pontuais.
Diploma Digital	100%	✓	✓	✓	✓	Entregue e em produção. Ajustes já realizados. Em homologação a integração com o SUAP Ensino.

3.3.6 Evolução do Programa - Planejamento das Contratações e Aquisições

Este programa contempla projetos vinculados ao Objetivo Estratégico relacionado ao planejamento das contratações e aquisições de TIC, visando assegurar a adequada provisão de bens e serviços necessários ao atendimento das demandas institucionais.

As iniciativas envolvem, principalmente, a organização e condução de processos de contratação, incluindo estudos técnicos preliminares, termos de referência e acompanhamento das aquisições.

Em 2025, a execução do programa foi impactada por fatores como a dependência de trâmites administrativos e a priorização de demandas institucionais, refletindo-se no cancelamento de alguns projetos.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **80%**, calculado com base na média do percentual de execução dos projetos.

No quadro 7 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Quadro 7 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Planejamento das Contratações e Aquisições - Objetivo Estratégico 6

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 - PROMOVER A MELHORIA DOS SERVIÇOS E A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC PROGRAMA: PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES Responsável: Direção de TIC						
Projeto	Inst. proc.	Licit.	Contrat.	Implant.	Situação	Observação
N6.1 - Solução de firewall (renovação da garantia)	✓	✓			Finalizado	A instrução processual foi concluída no dia 30/12/2025. Aguardar licitar e responder as respectivas dúvidas, questionamentos ou impugnações que se fizerem necessárias. ATUALIZAÇÃO: Foi realizado parte do empenho em 31/03, contrato em elaboração.
N6.3 - Estações de trabalho - computadores e notebooks	✓	✓	✓	✓	Finalizado	A adesão à ARP foi concluída. Os contratos estão sendo realizados de acordo com a necessidade das Unidades e disponibilidade de recursos.
N6.4 - Solução de redes sem fio (expansão)	✓	✓	✓		Finalizado	Processo de Contratação da Solução de Expansão da Rede Wi-fi concluído, licitado e contratado. Os equipamentos chegarão dia 23/04. Apoia o atendimento de dois projetos: Modernização/Atualização da infraestrutura de ativos de rede e Expansão da Rede nos campi. ATUALIZAÇÃO: Os equipamentos chegarão dia 23/04
N6.13 - Renovação da garantia dos Servidores dos Campi	0%				Não iniciado	Não foi possível executar esse projeto em 2025. Previsão de retomada em 2026.
N6.17 - Windows Server - Sistema operacional para os ambientes virtuais do Data Center	50%				Em andamento	A instrução processual da aquisição das licenças foi interrompido pois a aquisição não mais será realizada pelo IFB. As licenças serão adquiridas através do projeto aprovado de modernização do Suap - Implantação do módulo Educacional (Meta 1 do Plano de Trabalho),

						processo: https://suap.ifb.edu.br/processo_eletronico/processo/107460/ ps: aguardando verba para empenho.
N6.27 - Sistema Inventário de software e hardware - identificação e automatização de ativos	30%				Em andamento	Não foi possível finalizar a instrução processual deste projeto por várias questões estratégicas: priorização de outras contratações, custo elevado de ferramentas que podem atender a solução, necessidade de definição de processos internos na DTIC. Será realizado novo planejamento, o qual poderá beneficiar o IFB.
N6.18 - Solução de antivírus	✓	✓	✓	✓	Finalizado	Renovação do contrato até ago/ 2026 - Processo SUAP: https://suap.ifb.edu.br/processo_eletronico/processo/54014/ . ATUALIZAÇÃO: Um novo processo está em fase de elaboração do Termo de Referência, com previsão de encaminhamento para CGAQ em maio (contrato atual vigente até agosto/2026).

3.3.7 Evolução do Programa - Fortalecer Segurança da Informação

Este programa contempla projetos vinculados ao Objetivo Estratégico de Fortalecimento da Segurança da Informação, com foco na proteção dos ativos de TIC e na mitigação de riscos institucionais.

As iniciativas abrangem a implementação de controles de segurança, definição de normas e procedimentos, bem como a adoção de soluções tecnológicas voltadas à proteção da informação.

Em 2025, observou-se avanço parcial na execução das ações, com iniciativas em diferentes estágios de maturidade, incluindo projetos em andamento e parcialmente finalizados.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **57,14%**, calculado com base na média do percentual de execução dos projetos.

No quadro 8 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Quadro 8 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Fortalecer Segurança da Informação - Objetivo Estratégico 7

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 - FORTALECER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A PRIVACIDADE DOS DADOS PROGRAMA: FORTALECER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Responsável: Direção de TIC				
Projeto	Responsável	% Execução	Situação	Observação
N7.1 - Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC	DTIC/GovTIC	100%	Finalizado	Revisão da POSIC concluída, com atualização das diretrizes de segurança da informação e comunicação. Documento publicado.
N7.2 - Instituição da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - ETIR	DTIC/GovTIC	100%	Finalizado	ETIR instituída formalmente, com definição e designação dos membros responsáveis pela resposta a incidentes cibernéticos.
N7.3 - Treinamento e Conscientização dos colaboradores	DTIC/GovTIC	30%	Em andamento	Treinamento e conscientização em segurança da informação em andamento, com plano instituído e início da execução pela temática de autenticação. Ação parcialmente implementada, com necessidade de maior aderência ao calendário previsto ao longo de 2026.
N7.6 - Política e Implantação de Backup e Restore	DTIC/GovTIC	80%	Parcialmente finalizado	O backup dos principais sistemas está sendo realizado, porém está sendo feito o levantamento da Frequência de Replicação (RPO) do Prazo de Retenção e dos setores/cargos dos responsáveis.
N7.14 - Minimização de Dados e uso de Cookies	DTIC/GovTIC	0%	Não iniciado	Não foi possível iniciar este projeto em 2025 por conta da priorização de outros projetos.
N7.17 - Estabelecimento de uma Política de Uso de Contas Institucionais	DTIC/GovTIC	90%	Parcialmente Finalizado	A política de contas institucionais foi avaliada pelo CGD, conforme registro na Súmula 3/2025: https://suap.ifb.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/652779/ . Antes de publicadas, as normas complementares à POSIC serão revisadas e passarão por avaliação jurídica, de forma a evitar qualquer irregularidade em relação a temas sensíveis. Previsão de publicação no primeiro semestre de 2026.
N7.7 - Estabelecimento, manutenção e controle de inventário de ativos institucionais, softwares e provedores de serviço	DTIC/GovTIC	0%	Não iniciado	Houve um estudo das necessidades da demanda em que se tem como proposta a aquisição do Sistema Inventário de software e hardware, previsto no programa Planejamento das Contratações e Aquisições, além da necessidade de implantação de uma política de gestão de ativos de TI.

3.3.8 Evolução do Programa - Integração e Capacitação de Pessoal

Este programa contempla projetos vinculados ao Objetivo Estratégico de integração e capacitação de pessoal, com foco no desenvolvimento de competências e no fortalecimento das equipes de TIC.

As iniciativas envolvem ações de capacitação, treinamento e integração das equipes, visando aprimorar a capacidade operacional e a qualidade dos serviços prestados.

Em 2025, a execução do programa ocorreu de forma parcial, sendo impactada por limitações de disponibilidade de recursos e priorização de outras demandas institucionais.

O percentual de execução do programa em 2025 foi de **50%**, calculado com base na média do percentual de execução dos projetos.

No quadro 9 abaixo pode-se acompanhar a evolução dos projetos e informações relacionadas a cada um deles.

Quadro 9 - Relação Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 relacionados ao Programa - Fortalecer Segurança da Informação - Objetivo Estratégico 8

MONITORAMENTO E CONTROLE OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 - FORTALECER GESTÃO DE PESSOAS DE TIC E INCENTIVAR A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO PROGRAMA: INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL <i>Responsável: Direção de TIC</i>				
Projeto	Responsável	% Execução	Situação	Observação
N8.1 - Implementação do plano de capacitação e desenvolvimento das equipes de TIC	DTIC	0%	Não iniciado	Aguardando resultados da consultoria educacional da RNP, trabalho realizado junto ao Fórum de TI - FORTI do Conif. A partir desses resultados, será possível criar trilhas de conhecimento para diferentes perfis de servidores da área de TI da instituição. Neste ano foram realizadas consultas a todos os servidores de TI da instituição a fim de realizar levantamentos dos perfis profissionais de TI da instituição.
N8.2 - Desenvolvimento de ações de integração (forum TI)	DTIC	50%	Em andamento	Não foi possível oferecer o Segundo Encontro de TI no ano 2025, por conta das demandas institucionais e prazo inexecutável. Registro do Primeiro Encontro de TI: https://ifb.edu.br/reitori/42946-2-encontro-dos-profissionais-de-ti-do-ifb-promove-integracao-e-troca-de-experiencias

N8.3 - Treinamento e Capacitação em Segurança da Informação	DTIC	100%	Finalizado	Do total de 15 servidores da DTIC, 6 (40%) fizeram cursos voltados à área de Segurança da Informação, conforme cadastro das ações realizadas internamente. Estes seis servidores fizeram um total de 15 cursos na área. Levando isso em consideração, entendemos que a ação teve êxito, pois promoveu maior entendimento em SI, podendo estes servidores atuarem como replicadores do conhecimento na instituição.
---	------	------	------------	--

4. Síntese da Execução dos Projetos

No exercício de 2025, foram monitorados **50 projetos** previstos no PDTIC 2025–2030. Lembrando que, **três projetos foram suspensos** por indisponibilidade de recursos e **três são de execução contínua**, não sendo aplicável o cálculo de percentual médio de execução.

Quadro 9 - Distribuição dos Projetos Previstos PDTIC 2025/2030 ano 2025, por Situação


Situação	Quantidade	Percentual
Não iniciado	16	32%
Iniciado (até 25%)	2	4%
Em andamento (25% a 75%)	12	24%
Parcialmente Finalizado	6	12%
Finalizado	14	28%
Total	50	100%

Apesar de termos uma quantidade significativa de projetos **finalizados**, a análise consolidada indica predominância de projetos nas fases iniciais de execução, com maior concentração nas situações de **não iniciado** e **em andamento**, conforme a situação apresentada na Tabela.

Como complemento à análise, adotou-se uma relação entre os projetos finalizados e parcialmente finalizados e o total de projetos monitorados. Para o exercício de 2025, esse indicador resultou em aproximadamente **40%**. O valor de projetos finalizados foi de **28%**.

De forma geral, observa-se que a execução do PDTIC necessita de atenção, considerando o volume relevante de projetos com situação de não iniciado e iniciado, **36%**. A execução de muitos projetos foi impactada por limitações de equipe, priorização de demandas e dependência de contratações.

Embora se constate um volume significativo de projetos não finalizados no exercício de 2025, destaca-se o esforço das equipes de TIC na execução das **ações** planejadas, o que resultou em aproximadamente **68% de execução**. Esse desempenho evidencia o comprometimento das equipes e a realização de atividades que contribuíram de forma efetiva para o avanço dos projetos previstos no PDTIC.

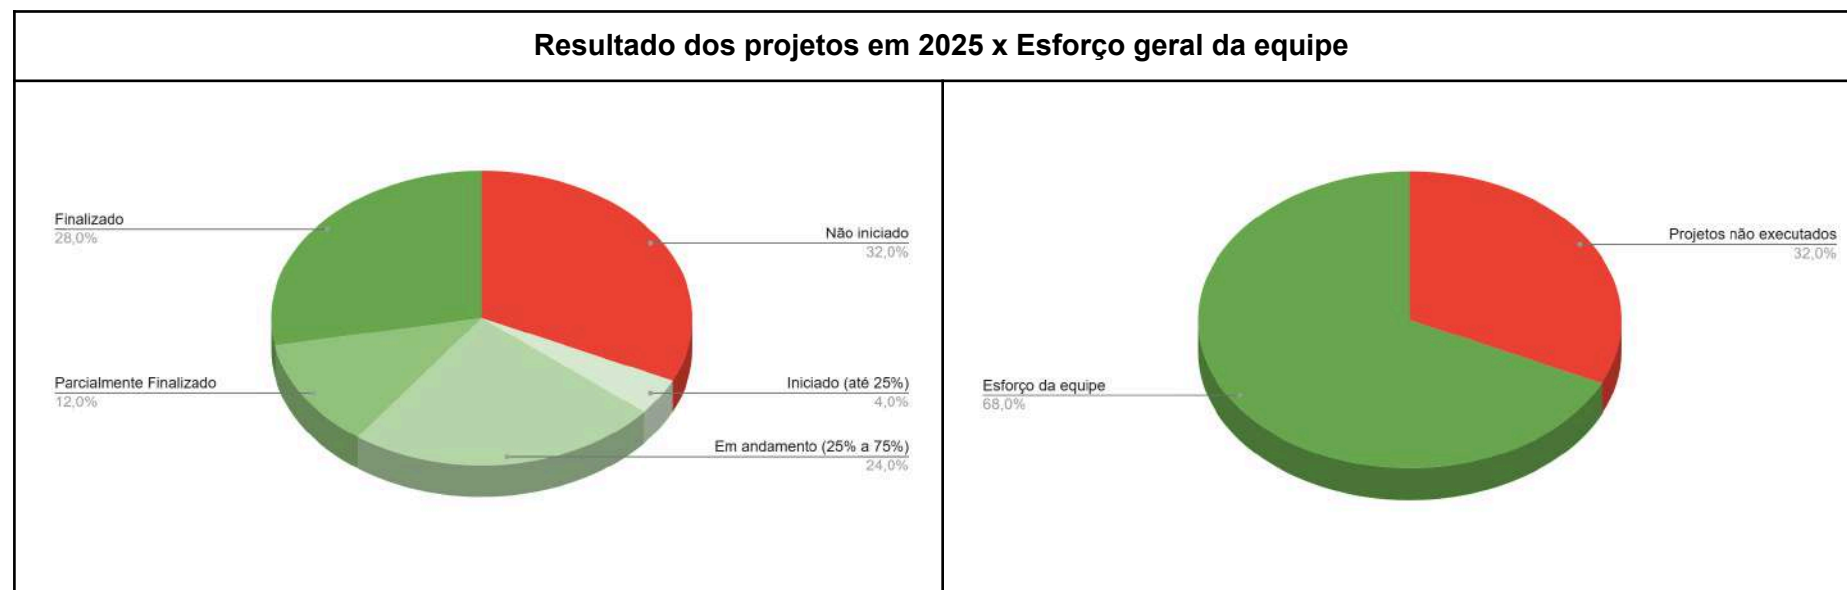

O crescimento institucional do IFB ampliou significativamente a complexidade e o volume das demandas relacionadas à TIC, especialmente no que se refere a processos de contratação, segurança da informação e governança. Nesse contexto, observa-se a necessidade de estruturação de equipes especializadas e de áreas formalmente instituídas para o atendimento dessas frentes. Atualmente, parte dessas atribuições, como a governança de TIC, ainda é conduzida por comissões, sem estrutura organizacional dedicada. Soma-se a isso a limitação de recursos humanos da área, que não acompanhou o ritmo de expansão da instituição, impactando a capacidade de atendimento e evolução das iniciativas estratégicas.

4.1 Projetos executados previstos e não previstos em 2025

Quadro 10 - Distribuição dos Projetos PDTIC 2025/2030 ano 2025, por Situação

Situação	Quantitativo
Não iniciado	16 (28,57%)
Iniciado (até 25%)	2 (3,57%)
Em andamento (25% a 75%)	15 (26,78%)
Parcialmente Finalizado	6 (10,72%)
Finalizado	17 (30,36%)
Total	56

A execução de ações não previstas impactou a realização dos projetos planejados no PDTIC. Em 2025, ao menos 6 iniciativas emergenciais foram conduzidas, com elevado nível de execução, enquanto 17 projetos foram concluídos, 21 parcialmente executados e 16 não foram realizados. Esse cenário evidencia que o atendimento a demandas prioritárias, embora relevante para a instituição, influenciou o cumprimento do planejamento originalmente estabelecido.

5. Considerações Finais

O acompanhamento dos projetos em 2025 permitiu avaliar o andamento das ações previstas no PDTIC, evidenciando avanços parciais na execução.

Apesar das entregas realizadas, observam-se desafios relacionados à capacidade operacional, priorização de demandas e fatores externos que impactam o ritmo de execução no período, fatores estruturais recorrentes que precisam ser aprimorados. Supõe-se para 2026, a continuidade dos projetos ainda não finalizados, e melhoria do monitoramento e controle dos programas.

Para os próximos ciclos, espera-se o aprimoramento na priorização dos projetos, o fortalecimento no acompanhamento e monitoramento do portfólio e alinhamento da execução à capacidade operacional disponível.

6. Resultados PDI 2024/2030 - DTIC (Ano 2025)

Síntese dos Resultados (SGI):

- Índice previsto: 80%
- Índice executado: 46,11%

Situação	Quantitativo
Resolvidas	14 (25,93 %)
Atendimento parcial	18 (33,33%)
Fechada	22 (40,74%)
Total de ações	54

Alinhamento PDTIC (perspectiva interna) x PDI (institucional)

SITUAÇÃO PDTIC	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO SGI	DESCRIÇÃO
Não Iniciado	projeto não atendido	Fechada	projeto não atendido (cancelado ou não executado)

Iniciado	25% de execução do projeto		
Em Andamento	> 25% e < 75% de execução do projeto		
Parcialmente Finalizado	> ou = 75% de execução do projeto	Atendimento parcial	pelo menos 20% de execução do projeto?
Finalizado	projeto 100% concluído	Resolvidas	projeto 100% concluído

Avaliação e Perspectiva

O ano de 2025 apresentou desafios relevantes para a área de TIC do IFB, especialmente em função da limitação da força de trabalho, agravada pela saída de pessoal, e pela necessidade de atendimento a demandas legais, que impactaram a priorização das ações.

Apesar de o indicador de execução do PDTIC ter ficado abaixo do esperado, foram alcançados resultados importantes em iniciativas essenciais ao funcionamento institucional. Destacam-se a implantação piloto do SUAP-EDU no Campus São Sebastião, o lançamento do diploma digital e a disponibilização do serviço de certificação do ENCCEJA com assinatura digital. Também foram implementados os módulos SUAP Pesquisa e SUAP Extensão, além da instrução de processos de contratação relevantes, como aquisição de equipamentos, computadores, solução de hiperconvergência e renovação da garantia de firewall.

O elevado volume de demandas institucionais exigiu a priorização de ações de maior impacto, resultando no cancelamento ou encerramento de cerca de 22 iniciativas. Ainda assim, 18 projetos foram parcialmente executados e 14 concluídos, evidenciando o esforço das equipes na condução das atividades planejadas.

Para o exercício de 2026, os projetos foram reavaliados em conjunto com o CGD, considerando sua criticidade e a capacidade operacional da área de TIC. Nesse contexto, busca-se estabelecer um planejamento mais realista e aderente às condições institucionais, com foco na priorização de iniciativas estratégicas, maior previsibilidade na execução e continuidade na evolução das soluções tecnológicas que apoiam as atividades acadêmicas e administrativas do IFB.

7. Projetos de 2026

PROGRAMAS: DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMAS				
Projeto	Responsável	% Execução	Situação	Observação

N5.19 - Modernização do SUAP/SUAP EDU	CSTIC	25%	Em Andamento	Projeto de desenvolvimento institucional via fundação CEFET-MINAS. Visando atender 4 metas: 4 metas: Meta 1 - Contratação de Software para o gerenciamento de credenciamento de contas. Meta 2 - Apoio Técnico ao novo sistema de administração acadêmica (Já em funcionamento) Meta 3 - Aperfeiçoamento do ambiente do sistema. Meta 4 - Integração do Moodle com o SUAP-EDU
N5.30 - Migração de dados para o novo portal do IFB	CSTIC	80%	Parcialmente Finalizado	Foi realizado um trabalho junto com bolsistas na criação de um script de migração de dados do portal antigo para o novo. Atualmente foi possível extrair todas as notícias do portal antigo, restando agora a categorização do material legado
N5.20 - Homologação e Implantação do módulo SUAP-Eventos	CSTIC	0%	Não Iniciado	Previsão para o segundo semestre.
N5.21 - Homologação e Implantação do módulo SUAP-Desenvolvimento Institucional	CSTIC	0%	Não Iniciado	Previsão para o segundo semestre.
N5.31 - Implantação do novo Portal do IFB	CSTIC	90%	Parcialmente Finalizado	Design System do governo já foi implantado, faltando alguns ajustes, em especial na exibição das notícias.
N5.7 - Desenvolvimento e implantação do SUAP Assistência Estudantil	CSTIC	40%	Em Andamento	A continuidade do projeto depende da aquisição do Windows Server que está em andamento.
PROGRAMA: FORTALECER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				
N7.10 - Definição de Processo de Gestão de Vulnerabilidades	DTIC	10%	Iniciado	Em fase inicial, buscando iniciativas de outras instituições e melhores práticas na literatura.

N7.18 - Definição de Processo de Configuração Segura de Ativos Institucionais	DTIC	0%	Não Iniciado	
N7.13 - Gestão de Resposta a Incidentes	DTIC	10%	Iniciado	Foi realizada uma reunião onde ficou definida ações dos membros da ETIR para o cumprimento das seguintes medidas: 17.2 O órgão estabelece e mantém informações de contato para relatar incidentes de segurança? 17.3 O órgão estabelece e mantém um processo institucional para relatar incidentes? 17.4 O órgão estabelece e mantém um processo de resposta a incidente?
N7.3 - Conscientização e Treinamento de Competências sobre Segurança	DTIC	50%	Em andamento	Plano de Conscientização em SI: https://www.ifb.edu.br/attachments/article/41381/Portaria%203_2025_RIFB_IFBRASILIA_PlanodeConscientizacao_SI_IFB.pdf
N7.19 - Provimento da atualização preventiva dos sistemas da Instituição	DTIC	0%	Não Iniciado	
N7.6 - Implantação efetiva do backup e restore	CITIC	90%	Atendida Parcialmente	Portaria IFB 15/2024 https://www.ifb.edu.br/attachments/article/3285/Portaria%20n%C2%BA%2015.2024%20-%20Estabelece%20as%20normas%20e%20procedimentos%20t%C3%A9cnicos%20para%20o%20backup%20e%20restaur%C3%A7%C3%A3o%20de%20arquivos%20no%20IFB.pdf
PROGRAMA: MANTER E ATUAR NA GESTÃO DE TIC				
N4.15 - Reestruturação do catálogo de serviços de TIC	Gestão	0%	Não Iniciado	A ser desempenhado no segundo semestre.
PROGRAMA: IMPLEMENTAR O MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC				

N4.5 - Promoção da conformidade do ambiente de TIC	GovTIC	20%	Iniciado	Até o momento foi realizada apenas a conformidade interna: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kqBc1lhRI2gzCTYw1rgkkRTJlm67DzKMUAu2Nyt109o/edit?gid=747888089#gid=747888089
N4.6 - Provimento da melhoria contínua do monitoramento do desempenho da TIC	GovTIC	50%	Em andamento	Situação dos Projetos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JKt-kAxTWX4ymBv8erA9cZnjvn-WBYKPMInlb_rdW8o/edit?gid=870248758#gid=870248758 Monitoramento do Portfólio: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DMJWB4uFPj2BCHhQw57ip_9ZLfecLPIhdTxbIVAk0/edit?gid=935220404#gid=935220404 Está em desenvolvimento uma proposta para regular o uso do GTI como sistema de gestão de projetos.
N4.7 - Implementação de mecanismos para avaliação dos serviços de TIC	GovTIC	50%	Em andamento	Foram criados três formulários que serão submetidos para análise das equipes. (uso da wi-fi, do Portal institucional e do SUAP)
N4.1 - Implementação de mecanismos para a Governança - gestão de riscos de TIC	GovTIC	90%	Parcialmente finalizado	Os artefatos construídos devem ser submetidos ao CGD após revisão e aprovação da Direção de TIC.
N4.3 - Envolvimento da alta administração nas iniciativas de TIC	GovTIC	25%	Iniciado	Primeira reunião do CGD em 23/04. Pautas já definidas. Relatório PDTIC (ANO 2025)
PROGRAMA: INTEGRAR E CAPACITAR O QUADRO DE PESSOAL				
N8.2 - Desenvolvimento de ações de Integração - (Fórum de TI)	DTIC	50%	Em andamento	Foi realizado o 3º Encontro de TI em 01/04 no Campus Samambaia que teve como pauta principal: Revisão das Normas Complementares de Segurança da Informação.
N8.4 - Incentivar a difusão do Conhecimento de TIC	DTIC	0%	Não iniciado	Previsto para o segundo semestre de 2026.
PROGRAMA: PROVER INFRAESTRUTURA DE TIC				

N1.17 - Implantação e continuidade dos serviços de firewall	CITIC	0%	Não Iniciado	Aguardando empenho da solução.
N1.16 - Implementação da solução de Data Center - Hiperconvergência	CITIC	0%	Não Iniciado	Aguardando empenho da solução.
N1.15 - Atualização do IDP-IFB (Provedor de Identidade)	CITIC	0%	Não Iniciado	
N7.6 - Implantação efetiva do backup e restore	CITIC	90%	Atendida Parcialmente	Portaria IFB 15/2024 https://www.ifb.edu.br/attachments/article/3285/Portaria%20n%C2%BA%2015.2024%20-%20Estabelece%20as%20normas%20e%20procedimentos%20t%C3%A9cnicos%20para%20o%20backup%20e%20restaur%C3%A7%C3%A3o%20de%20arquivos%20no%20IFB.pdf
N1.8 - Planejamento do parque tecnológico dos novos campi	CITIC	100%	Finalizado	Elaboração da documentação do planejamento concluída. Para implementar vai necessitar de aquisição dos equipamentos e conclusão da obra de construção predial.
N1.1 - Implantação da Expansão da Rede Wi-Fi	CITIC	0%	Não Iniciado	Aguardando recebimento dos equipamentos.
N1.13 - Migração do Domínio de E-mail	CITIC	100%	Finalizado	
N1.6 - Migração do Active Directory	CITIC	0%	Não Iniciado	
PROGRAMA: PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS				

N2.1 - Implementação da Transformação Digital do serviço de 2ª via de Diploma	CSTIC			Devido a implantação do SUAP-EDU, este programa precisará ser reavaliado, pois algumas regras de negócio mudaram. Previsão de retomada das atividades no segundo semestre de 2026.
N2.6 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Educação à Distância - PS- EAD	CSTIC			
N2.4 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Ensino Profissional e Técnico - PS - EPT	CSTIC			
N2.3 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Formação Inicial e Continuada - PS - FIC	CSTIC			
N2.5 - Inscrição em Processo Seletivo em Curso de Graduação - PS-GRAD	CSTIC			
N2.10 - Matrícula em Curso de Educação à Distância - MAT-EAD	CSTIC			
N2.8 - Matrícula em Curso de Ensino Profissional e Técnico - MAT-EPT	CSTIC			
N2.7 - Matrícula em Curso de Formação Inicial e Continuada - MAT-FIC	CSTIC			
N2.9 - Matrícula em Curso de Graduação - MAT-GRAD	CSTIC			

PROGRAMA: REALIZAR O PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TIC				
N6.14 - Aquisição de solução de Hiperconvergência	DTIC	100%	0%	Processo instruído - Adesão a Ata.
N6.13 - Aquisição e Renovação das Garantias dos Servidores dos Campi	DTIC	10%	Iniciado	DFD publicado, em indicação da EPC.
N6.18 - Aquisição do antivírus	DTIC	93%	Em andamento	DFD publicado, Análise de Mercado e Pesquisa de preços realizados, ETP, TR e MR em fase final de elaboração no comprasnet.
N6.17 - Aquisição do Windows Server - Sistema Operacional para os ambientes virtuais do Data Center	DTIC	0%	Não iniciado	
PROJETOS EXECUTADOS E NÃO PREVISTOS				
Contratação do serviço de telefonia fixa	-	100%	Finalizado	Processo de planejamento da contratação 23098.000398.2026-95 e Contrato 08/2026 realizados.
